uvicuo

CONFIDENCIAL

LIBRO DEL PILOTO

Telepeaje con Uvicuo en Bimbo Sureste

Qué gana la operación, cómo trabajamos día a día y cómo medimos el primer mes.

2 nov primeros cruces con Uvicuo en Puebla, Villahermosa, Veracruz y Mérida

Preparado para	Folio	Fecha
Bimbo Sureste	LP-BSUR-2026-10 · v1	22 oct 2026

Estado	Aprueba	Vigencia	Responsable
Para visto bueno	Transportes, Bimbo	2–30 nov 2026	Uvicuo · Operaciones

00 Resumen ejecutivo

Durante noviembre, Bimbo Sureste opera su telepeaje con Uvicuo y Televía en cuatro territorios. Al cierre del mes, siete criterios medibles deciden si se extiende al resto de Bimbo.

Territorios
4
Puebla, Villahermosa, Veracruz y Mérida

Primeros cruces
2 nov

Soporte
24/7
Grupo de WhatsApp con Uvicuo y Televía

Casetas identificadas
96%
de las casetas de su histórico ya están en la red de Televía; el resto se valida con las rutas de prueba

Tema	En una línea
Qué cambia	Uvicuo atiende las fallas en caseta 24/7, liga cada cruce a su viaje, concilia contra la factura y levanta las aclaraciones.
Cuándo	Prueba controlada el 27 y 28 de octubre, migración el 31 de octubre y 1 de noviembre, primeros cruces el 2 de noviembre.
Cómo se mide	Siete criterios con meta y fuente de datos, revisados cada jueves con un semáforo.
Quién decide	Transportes, con Compras, en la primera semana de diciembre, con este libro lleno.
Qué necesitamos	Rutas de prueba el 24 de octubre, medio de pago el 27 y visto bueno de este documento el 26.

01 Objetivo y alcance

El piloto prueba en operación real el modelo completo: telepeaje, soporte, conciliación, aclaraciones y reportes, para decidir con datos si se extiende.

OBJETIVOS

1. Validar los procesos operativos de Uvicuo en la operación de Sureste, de la caseta al reporte.
2. Alinear lo que espera cada región y cómo se trabaja entre Bimbo, Uvicuo y Televía.
3. Generar la evidencia para decidir si el modelo se extiende al resto de Bimbo.

INCLUYE

Componente	Alcance
Territorios	Puebla, Villahermosa, Veracruz y Mérida, con sus rutas.
Unidades	Tractores de Sureste dados de alta en Aliado. La región habló de 128; el número final sale de la carga.
Telepeaje	Tags de Televía, uno por unidad, pagados con la tarjeta que vincula Tesorería.
Soporte	Atención de incidentes en caseta 24/7 por WhatsApp, con Televía.
Conciliación	Cruces contra viajes y bitácoras de Aliado y contra la factura de Televía.
Aclaraciones	Detección y gestión con las concesionarias de los cobros en contra.
Reportes	Mensual de conciliación, aclaraciones y gasto, y sesión ejecutiva de indicadores.

NO INCLUYE EN ESTA FASE

- Regresar los cruces hacia Aliado y la carta porte: se revisan con producto si el piloto se extiende.
- Casetas fuera de la red de Televía o que solo aceptan efectivo.
- Otras regiones de Bimbo y otros gastos de ruta, como combustible.

SUPUESTOS

- Los viajes se abren en Aliado antes de salir a ruta.

- Tesorería vincula el medio de pago antes de la prueba controlada.
- Cada jefe de transporte tiene acceso a Uvicuo y al grupo de WhatsApp desde el arranque.

02 Lo que gana Sureste

Sureste deja de resolver sola las fallas en caseta y de pagar sin revisar: Uvicuo atiende 24/7, liga cada cruce a su viaje y pelea los cobros de más.


Área	Hoy	Con Uvicuo
Fallas en caseta	Soporte por teléfono de 9 a 6, con esperas de media hora o más. Hay casetas donde el tag a veces no pasa y el caso nunca se cerró con el proveedor.	Grupo de WhatsApp 24/7 con Uvicuo y Televía. Gestionamos con la concesionaria y damos seguimiento hasta que el tag cruza.
Efectivo en ruta	Cuando el tag falla, el usuario paga en efectivo, si lo trae.	Antes del arranque avisamos a las concesionarias de cada ruta qué tags nuevos van a cruzar, para reducir los rechazos.
Cobros de más	Los cobros no se revisan uno por uno: ejes de más, cobros dobles o casetas fuera de ruta pasan sin reclamo.	Revisamos cada cruce contra la unidad y su configuración en Aliado, y levantamos las aclaraciones con las concesionarias.
Conciliación	El cruce no está ligado al viaje ni a la bitácora.	Cada cruce ligado a unidad, viaje y bitácora, y conciliado contra la factura en los primeros días del mes siguiente.
Control del gasto	Los tags se limitan con un promedio para contener el gasto.	Tags sin tope. El control pasa al análisis: desviaciones contra el promedio por unidad, ruta, región y concesionaria.
Trabajo administrativo	Conciliar y reclamar queda a cargo de la operación, además de su trabajo diario.	Uvicuo lleva la conciliación y las aclaraciones. La operación revisa el reporte y decide.

Cómo lo vamos a demostrar

Cada fila tiene un criterio en la sección 06 y se revisa en el semáforo semanal. Al cierre del mes, este mismo libro se llena con lo que pasó.

03 Cómo funciona

Uvicuo es el punto donde se juntan el viaje de Aliado, el cruce de Televía y el pago de Tesorería; de ahí salen la conciliación, las aclaraciones y los reportes.

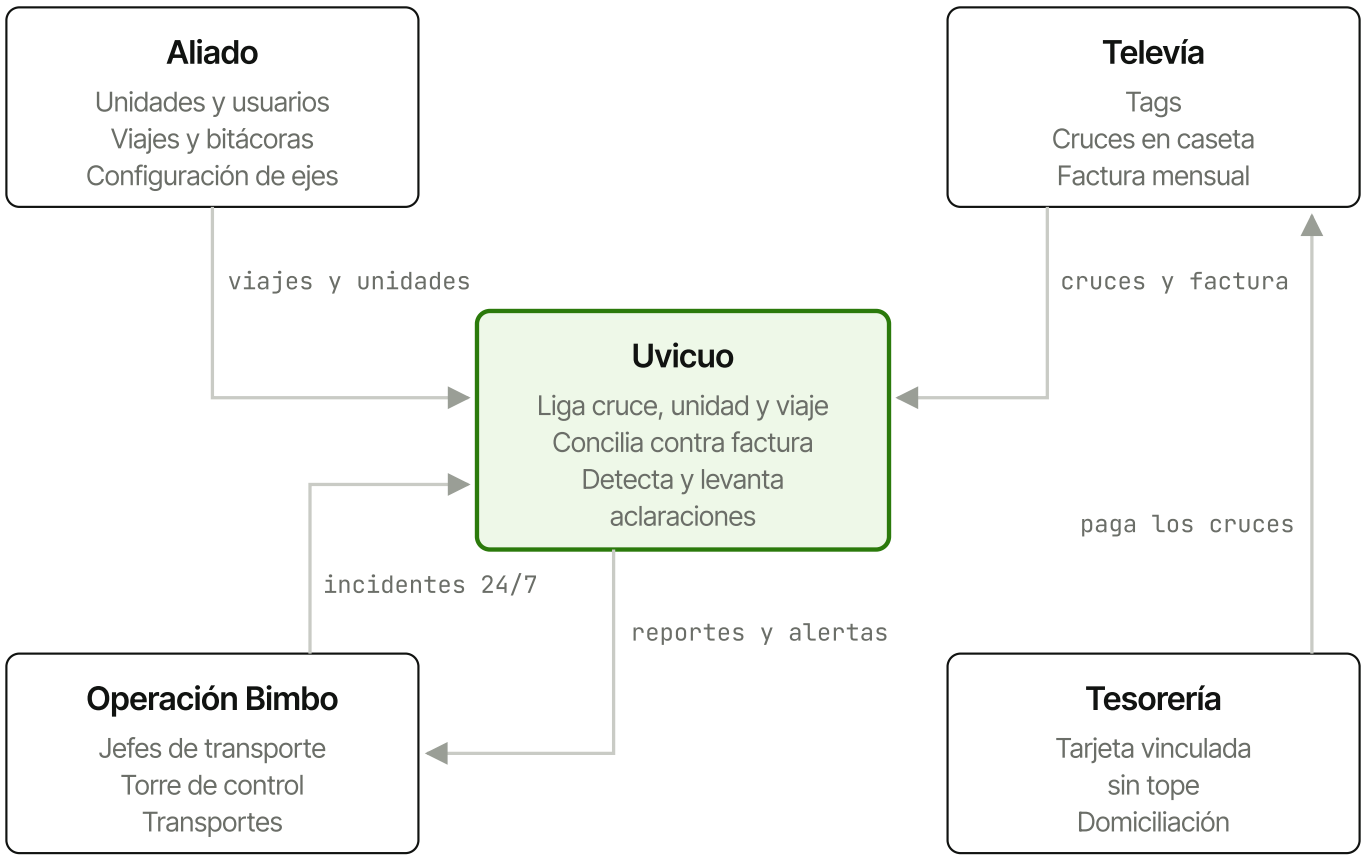

EL RECORRIDO DE UN CRUCE

Paso	Qué pasa	Sistema
1	El jefe de transporte abre el viaje de la unidad.	Aliado
2	La unidad cruza la caseta y el tag de Televía registra el paso.	Televía
3	El cruce se cobra a la tarjeta vinculada por Tesorería.	Televía, Tesorería
4	Uvicuo liga el cruce a la unidad, al viaje y a la configuración de ejes.	Uvicuo
5	Si el cobro no cuadra, Uvicuo levanta la aclaración con folio.	Uvicuo, Televía

Paso	Qué pasa	Sistema
6	Al cierre del mes, Uvicuo concilia todo contra la factura y entrega el reporte.	Uvicuo

Si el viaje no se abrió en Aliado

El cruce se cobra igual, pero queda sin viaje. Uvicuo lo marca y la torre de control lo asigna; por eso abrir el viaje a tiempo es parte de los compromisos de la operación.

04 Plan de trabajo

Cinco fases, cada una con su entregable y una condición para pasar a la siguiente.

Fase	Fechas	Entregable	Pasa a la siguiente si…
1 · Preparación	22–26 oct	Usuarios, unidades cargadas, rutas de prueba validadas y avisadas a las concesionarias.	Las rutas de los cuatro territorios están validadas.
2 · Prueba controlada	27–28 oct	Una unidad por territorio en su ruta más complicada.	Las cuatro unidades cruzaron y el cruce quedó ligado a su viaje.
3 · Migración	31 oct–1 nov	Tags de Televía pegados y el tag anterior retirado en todas las unidades.	Se cumplen las condiciones de la lista de abajo.
4 · Operación asistida	2–30 nov	Operación diaria con soporte 24/7 y semáforo semanal.	Termina el mes.
5 · Evaluación	1–5 dic	Reporte del mes y este libro con el semáforo final.	Decisión de extender, ajustar o detener.

CALENDARIO

Fecha	Hito	Responsable
22 oct	Arranque operativo: plan, metodología, accesos y usuarios.	Uvicuo
24 oct	Ruta de prueba de cada territorio: unidad, tag y casetas.	Operación Bimbo
26 oct	Rutas validadas y enviadas a Televía para avisar a las concesionarias.	Uvicuo
26 oct	Visto bueno de este libro.	Transportes
27 oct	Sesión con Tesorería para vincular el medio de pago.	Compras, Tesorería

Fecha	Hito	Responsable
27–28 oct	Prueba controlada.	Operación Bimbo, Uvicuo, Televía
29 oct	Resultado de la prueba y decisión de migrar.	Transportes, Uvicuo
31 oct–1 nov	Migración de tags.	Operación Bimbo, Uvicuo
2 nov	Primeros cruces con Uvicuo.	Todos
Cada jueves	Sesión de seguimiento con semáforo.	Todos
1–5 dic	Reporte del mes y evaluación.	Uvicuo, Transportes

CONDICIONES PARA MIGRAR

Condición	Responsable	Se confirma
Medio de pago vinculado y probado.	Tesorería, Uvicuo	27 oct
Unidades y usuarios cargados y revisados por cada jefe de transporte.	Uvicuo, Operación Bimbo	28 oct
Tags de Televía activos y asignados a su unidad.	Televía, Uvicuo	29 oct
Rutas avisadas a las concesionarias.	Uvicuo, Televía	29 oct
Instructivo de instalación entregado y capacitación hecha.	Uvicuo	29 oct
Prueba controlada sin pendientes abiertos.	Uvicuo, Operación Bimbo	29 oct

FIN DE SEMANA DE MIGRACIÓN

Cuándo	Qué se hace	Quién
Viernes 30	Confirmación final de tags activos y del medio de pago. Grupo de WhatsApp con guardia reforzada.	Uvicuo, Televía

Cuándo	Qué se hace	Quién
Sábado 31	Cada territorio retira el tag anterior y pega el de Televía según el instructivo. Uvicuo registra las unidades migradas.	Operación Bimbo, Uvicuo
Domingo 1	Unidades pendientes y revisión de que ninguna traiga dos tags.	Operación Bimbo, Uvicuo
Lunes 2	Primeros cruces. Uvicuo revisa que cada unidad migrada registre su primer cruce.	Uvicuo

Si una condición no se cumple

La migración se mueve al siguiente fin de semana disponible. Lo decidimos juntos el jueves 29 de octubre con el resultado de la prueba.

05 Manual de operación

Seis procedimientos cubren la operación diaria. Cada uno dice qué lo dispara, quién hace cada paso y dónde queda el registro.

P1 · Incidente en caseta

DUEÑO: SOPORTE UVICUO

01	02	03	04
Reporta	**Acusa**	**Gestiona**	**Cierra**
Usuario o jefe de transporte	Soporte Uvicuo	Uvicuo con Televía	Soporte Uvicuo
En el grupo de WhatsApp, con el formato del anexo A.	Confirma que lo tomó, en 10 minutos o menos.	Contacta a la concesionaria para que la unidad pase.	Confirma el cruce y lo registra en la bitácora.

- **Registro:** bitácora de incidentes con hora de reporte, acuse y cruce, número económico, tag, caseta y causa.
- **Si no hay acuse:** el jefe de transporte llama al líder operativo de Uvicuo; después, a Dirección.

P2 · Saldo y medio de pago

DUEÑO: UVICUO

1. Tesorería vincula la tarjeta, sin tope, antes de la prueba controlada.
2. Uvicuo revisa los cobros todos los días a las 9:00.
3. Si hay un adeudo, Uvicuo avisa ese mismo día por correo y llamada a Compras y Tesorería.
4. Si la falla es de Uvicuo o de Televía, los cruces siguen mientras se resuelve.
5. Si el adeudo es por fondos de Bimbo, se acuerda con Compras qué hacer, siempre con aviso previo a la operación.

P3 · Altas, bajas y tags adicionales

DUEÑO: JEFE DE TRANSPORTE

1. Las unidades llegan de Aliado. Cada jefe de transporte revisa las suyas en Uvicuo y da de alta o baja unidades y usuarios.
2. Para pedir tags, el jefe obtiene el visto bueno de gasto de su gerencia regional.
3. El jefe escribe a Uvicuo con el formato del anexo B.

4. Uvicuo pide los tags a Televía, que los envía directo a la región. El plazo de entrega se confirma con Televía antes del arranque.
5. Al pegarlo, el jefe confirma en el mismo correo y Uvicuo lo asigna a la unidad.

P4 · Instalación y cambio de tag

DUEÑO: JEFE DE TRANSPORTE

1. Se retira el tag actual.
2. Se limpia el parabrisas y se pega el tag de Televía al centro, siguiendo el instructivo por tipo de unidad.
3. Se confirma en Uvicuo el número de tag de la unidad.

Nunca dos tags activos
Si una unidad trae dos tags, pueden interferir y no pasar ninguno, o cobrar doble. Los tags de Televía que ya están pegados siguen inactivos hasta la migración.

P5 · Aclaraciones

DUEÑO: UVICUO

01	02	03	04
Detecta	**Levanta**	**Da seguimiento**	**Se refleja**
Uvicuo	Uvicuo con Televía	Uvicuo	Concesionaria
Ejes de más, cobro doble o caseta fuera de la ruta de la unidad.	Con folio, en 20 días o menos desde el cruce.	Estatus en la plataforma y en el reporte mensual.	Si se acepta, la bonificación aparece en la factura.

Decide la concesionaria. La bonificación de una aclaración aceptada llega hasta 60 días después; por eso el mes se mide por lo detectado y levantado, y lo recuperado se reporta conforme llega.

P6 · Conciliación mensual

DUEÑO: UVICUO

1. Uvicuo liga cada cruce a su unidad, viaje y bitácora de Aliado.
2. Los cruces sin viaje se marcan y la torre de control los asigna durante el mes.
3. Al llegar la factura de Televía, Uvicuo concilia cruce por cruce.
4. En los primeros 5 días hábiles entrega el reporte del mes (sección 13).

06 Cómo medimos el éxito

Siete criterios deciden si el mes funcionó. Cada uno tiene meta, fórmula y fuente, para que cualquiera pueda calificarlo igual.

#	Criterio	Meta	Cómo se calcula	Fuente
C1	**Incidentes atendidos**	Acuse ≤ 10 min. Resolución ≤ 30 min, promedio de 15 a 20.	Minutos entre reporte y acuse, y entre reporte y cruce, por incidente.	Bitácora de incidentes
C2	**Continuidad**	0 unidades detenidas por causa de Uvicuo o Televía.	Incidentes con causa: tag inactivo, bloqueo o medio de pago.	Bitácora de incidentes
C3	**Cambio de tags seguro**	100% de unidades migradas con cruce en Televía. 0 cobros dobles.	Unidades con cruce entre unidades migradas; cruces contra la última factura anterior.	Uvicuo y factura anterior
C4	**Conciliación**	Reporte en ≤ 5 días hábiles. 100% de cruces ligados o marcados.	Fecha de entrega; cruces ligados más marcados entre cruces facturados.	Reporte mensual
C5	**Aclaraciones**	≥ 95% de diferencias en contra con folio. Identificar ≥ 1% del gasto.	Folios entre diferencias detectadas; monto en aclaración entre gasto del mes.	Reporte mensual
C6	**Gasto visible**	Reporte por región, unidad y tag, con desviaciones.	Entregado en el formato aprobado.	Reporte mensual
C7	**Menos trabajo administrativo**	La operación no concilió ni reclamó por su cuenta.	Confirmación de las gerencias regionales.	Correo al cierre

SEMANA DE ESTABILIZACIÓN

La primera semana de operación, del 2 al 8 de noviembre, es de ajuste: cambian los tags, los usuarios aprenden a reportar y las concesionarias reconocen los tags nuevos. Esa semana todo se atiende y se registra igual, pero C1 y C2 se califican sobre las semanas 2 a 4, con la semana 1 reportada aparte.

FALLAS CONOCIDAS ANTES DEL ARRANQUE

Con las rutas de prueba armamos una línea base de fallas que ya existen hoy y la aprobamos junto con este libro. Lo que pase ahí se atiende y se registra, cuenta para el acuse de C1, pero no para su resolución ni para C2.

- Casetas donde hoy el paso del tag no siempre se refleja, como las que reportó Villahermosa.
- Casetas de las rutas que hoy se pagan en efectivo.
- Viajes que no se abren a tiempo en Aliado por conectividad del GPS.

QUIÉN DEFINE LA CAUSA DE CADA INCIDENTE

Cada incidente se clasifica en una de tres causas: operación de Bimbo, concesionaria, o Uvicuo y Televía. Soporte Uvicuo propone la causa y se valida cada jueves en el semáforo, para que al cierre del mes no haya casos en disputa.

INDICADORES QUE SE REPORTAN, PERO NO DECIDEN

- Minutos de unidad detenida por incidente y su causa.
- Porcentaje de incidentes resueltos en menos de 30 minutos.
- Gasto por región, ruta y concesionaria, contra el promedio.
- Monto bonificado por aclaraciones, conforme se refleja en factura.
- Impacto financiero del mes: aclaraciones identificadas, cobros de más evitados y desviaciones de gasto, presentado en la sesión ejecutiva.

COMPROMISOS DE BIMBO QUE SOSTIENEN LOS CRITERIOS

Compromiso	Criterios
Reportar cada incidente con el formato del anexo A.	C1 · C2
Retirar el tag anterior al pegar el de Televía.	C3
Abrir los viajes en Aliado antes de salir a ruta.	C4 · C6
Mantener el medio de pago vinculado y con fondos.	C2

Si un compromiso no se cumple, el caso afectado sale del cálculo del criterio que sostiene.

LO QUE NO CUENTA CONTRA UN CRITERIO

- Fallas del lector o la antena de la caseta, que son de la concesionaria. Se atienden igual y se registran.
- Casetas fuera de la red de Televía o que solo aceptan efectivo.
- Unidades detenidas por falta de fondos de Bimbo, o por un tag no pegado, dañado o pegado fuera de instructivo.
- El resultado de una aclaración: lo decide la concesionaria.

07 Gobierno del proyecto

Tres espacios gobiernan el piloto: el correo diario hasta el arranque, la sesión semanal con semáforo y la sesión ejecutiva mensual.

Espacio	Cuándo	Participan	Para qué
Correo diario	9:00, hasta el 2 de noviembre	Asistentes del piloto	Qué se movió, qué sigue, qué necesitamos.
Sesión semanal	Jueves	Operación Bimbo, Compras, Uvicuo	Semáforo de los siete criterios y pendientes con responsable.
Sesión ejecutiva	Mensual	Transportes, gerencias regionales, Uvicuo	Indicadores e impacto financiero. Solo con Bimbo.
Evaluación	1–5 dic	Transportes, Compras, Uvicuo	Decisión de extender, ajustar o detener.

SEMÁFORO

Color	Qué significa	Qué pasa
🟢 **Verde**	Va en meta.	Se reporta y sigue.
🟡 **Amarillo**	Riesgo de no llegar a la meta.	Acción con responsable y fecha, revisada el jueves siguiente.
🔴 **Rojo**	No se cumplió la meta en la semana.	Causa y acción el mismo día. Si se repite, pasa a la sesión ejecutiva.

En la semana de estabilización (2 al 8 nov) el semáforo se reporta, pero un rojo no escala a la sesión ejecutiva.

CONTROL DE CAMBIOS

- Este libro es la regla del piloto desde su visto bueno.
- Un cambio a un criterio, una meta o un proceso se propone en la sesión semanal y queda en una versión nueva, con fecha y quién lo aprobó.

- Las metas no se cambian durante la última semana del mes.

08 Organización y responsabilidades

Cada jefe de transporte opera las unidades de su región. Giselle y Miguel Ángel, gerentes regionales al mismo nivel, llevan la torre de control y le reportan a Juan.

BIMBO SURESTE

Persona	Área	Rol en el piloto
Juan Corte	Transportes	Visto bueno del piloto y de este libro. Indicadores e impacto financiero. Le reportan las dos gerencias regionales.
Giselle Guillén	Gerencia regional	Puebla y otras regiones de Sureste. Torre de control con Miguel Ángel. Visto bueno de gasto para tags.
Miguel Ángel Rodríguez	Gerencia regional	Lidera el piloto. Torre de control con Giselle. Aprueba el formato de reportes. Rutas y asignación de vehículos.
Rolando Leyva	Supervisión regional	Conciliación de peajes y cruces de Sureste.
Carlos Avilés	Transporte Puebla	Unidades, usuarios y tags de Puebla.
Araceli Díaz	Transporte Villahermosa	Unidades, usuarios y tags de Villahermosa.
Por confirmar	Transporte Veracruz	Unidades, usuarios y tags de Veracruz.
José Luis Herrera	Transporte Mérida	Unidades, usuarios y tags de Mérida.

GRUPO BIMBO, UVICUO Y TELEVÍA

Persona	Área	Rol en el piloto
Brenda Mijares	Compras	Coordina el proyecto y el enlace con Tesorería.
Sergio López	Compras	Enlace con Tesorería.
Tesorería	Finanzas	Medio de pago y domiciliación.

Persona	Área	Rol en el piloto
José María Tabares	Uvicuo · Operaciones	Responsable del piloto por Uvicuo: arranque, carga, soporte y reportes.
Iker H. Escandon	Uvicuo · Dirección	Último nivel de escalación de Uvicuo.
Soporte Uvicuo	Uvicuo · Operaciones	Incidentes en caseta, 24/7.
Televía	Proveedor del tag	Tags, cruces y factura.

MATRIZ RACI

R ejecuta · A responde por el resultado · C se consulta · I se informa

Actividad	Jefes	Torre	Transp.	Compras	Tesor.	Uvicuo	Televía
Rutas de prueba	R	A	I	I	—	C	—
Medio de pago	—	—	I	A	R	C	C
Carga de unidades y usuarios	C	I	—	—	—	R	—
Instalación de tags	R	A	—	—	—	C	C
Incidente en caseta	C	I	—	—	—	A	R
Pedido de tags	R	A	—	—	—	C	R
Cruces sin viaje	C	R	—	—	—	A	—
Aclaraciones	—	I	I	—	—	A	R
Conciliación y reportes	—	C	I	I	—	A	C
Decisión de extender	—	C	A	C	—	R	—

Por confirmar con Juan

Qué territorios del piloto lleva cada gerencia regional, y quién lleva Transporte en Veracruz.

09 Escalación

Cada evento tiene un primer responsable y dos niveles de escalación. Dentro de Bimbo: jefe de transporte, torre de control, Transportes. Dentro de Uvicuo: Soporte, líder operativo, Dirección.

Evento	Lo atiende	Si no se resuelve	Último nivel
Tag rechazado en caseta	Soporte Uvicuo, en el grupo	Líder operativo de Uvicuo, por llamada	Dirección de Uvicuo
Cobro o medio de pago	Uvicuo avisa a Compras y Tesorería	Compras con Tesorería	Transportes y Dirección de Uvicuo
Cruce sin viaje	Torre de control	Jefe de transporte de la región	Gerencia regional
Aclaración rechazada	Uvicuo con Televía	Sesión semanal	Sesión ejecutiva
Uso de la plataforma	Jefe de transporte	Torre de control	Transportes
Pedido de tags atrasado	Líder operativo de Uvicuo	Televía	Dirección de Uvicuo
Desacuerdo con un criterio	Sesión semanal	Sesión ejecutiva	Transportes y Dirección de Uvicuo

10 Comunicación

Lo urgente va por WhatsApp; lo que se decide, por correo o en sesión. Nada importante se queda en una llamada sin registro.

Canal	Para qué	Quién	Cuándo
Grupo de WhatsApp	Incidentes en caseta.	Jefes, torre de control, Soporte Uvicuo, Televía.	24/7.
Correo diario	Avance hacia el arranque.	Uvicuo a los asistentes.	9:00, hasta el 2 nov.
Sesión semanal	Semáforo y pendientes.	Operación, Compras, Uvicuo.	Jueves.
Sesión ejecutiva	Indicadores.	Transportes, gerencias, Uvicuo.	Mensual.
Correo a un territorio	Temas de una región.	Al jefe, con copia a su gerencia regional.	Prueba y primer mes.
Reporte mensual	Conciliación, aclaraciones, gasto.	A Transportes, gerencias y Compras.	5 días hábiles.
Correo de pedidos	Tags, altas y bajas.	Jefe de transporte a Uvicuo.	Cuando se necesite.

Después del primer mes, los correos con cada territorio pueden ir directo al jefe de transporte si así lo deciden las gerencias regionales.

11 Riesgos y contingencias

Ocho riesgos identificados, cada uno con su prevención y lo que hacemos si pasa.

Riesgo	Impacto	Prevención	Si pasa
Medio de pago no listo el 27	Alto	Sesión con Tesorería agendada; seguimiento diario.	La prueba y la migración se mueven una semana.
Rechazos en casetas pequeñas al arranque	Medio	Aviso previo a las concesionarias de cada ruta y línea base de fallas conocidas.	Semana de estabilización con guardia reforzada; los casos de la línea base no cuentan contra C2.
Unidad con dos tags	Alto	Instructivo y revisión del domingo 1.	Se retira el tag anterior y se aclara cualquier cobro doble.
Viajes no abiertos en Aliado	Medio	Recordatorio a jefes; cruces marcados a diario.	La torre de control asigna el cruce en la semana.
Tags de Televía ya pegados	Medio	Siguen inactivos hasta la migración.	Se activan solo con el retiro del tag anterior.
Grupo de WhatsApp sin respuesta	Alto	Guardia con responsable por turno.	Llamada directa al líder operativo y a Dirección.
Factura de Televía tarde	Bajo	Fecha de corte acordada con Televía.	El plazo de 5 días hábiles corre desde la factura.
Concesionaria rechaza aclaraciones	Medio	Evidencia de ejes y viaje en cada folio.	Se reporta y se insiste; no cuenta contra el criterio.

12 Accesos y capacitación

Cada persona entra a Uvicuo con el perfil de lo que necesita hacer, y recibe la capacitación antes de la migración.

Perfil	Quién	Puede
Administración regional	Jefes de transporte	Ver sus unidades, usuarios, cruces y gasto; altas y bajas; pedir tags.
Torre de control	Gerencias regionales	Ver todas las regiones; asignar cruces sin viaje; revisar incidentes.
Consulta ejecutiva	Transportes, Compras	Ver reportes, indicadores y el semáforo.

CAPACITACIÓN

Tema	Para quién	Cuándo
Uso de la plataforma: unidades, usuarios, cruces y reportes.	Jefes y torre de control	Semana del 26 oct
Cómo reportar un incidente en el grupo.	Jefes y usuarios	Semana del 26 oct
Instalación y cambio de tag.	Jefes y talleres	Antes del 31 oct
Lectura del reporte mensual.	Gerencias, Transportes, Compras	Con el primer reporte

13 Reportes

Un reporte mensual con tres partes y un semáforo semanal; el formato lo aprueba la gerencia regional con un ejemplo antes del arranque.

Reporte	Qué trae	Cuándo
Conciliación	Cada cruce con unidad, viaje, bitácora, caseta, ejes y monto; cruces sin viaje; diferencias contra la factura.	Mensual, 5 días hábiles
Aclaraciones	Folio, cruce, caseta, monto, ejes reales contra cobrados, estatus y factura donde se refleja.	Mensual, 5 días hábiles
Gasto	Por región, unidad, ruta, tag y concesionaria, con desviaciones contra el promedio.	Mensual, 5 días hábiles
Semáforo	Los siete criterios con su dato de la semana.	Cada jueves
Incidentes	Bitácora con tiempos y causa de cada incidente.	Cada jueves

14 Visto bueno

Con el visto bueno de Transportes, este libro queda como la regla del primer mes.

Qué	Quién	Fecha
Ruta de prueba de cada territorio.	Operación Bimbo	24 oct
Sesión con Tesorería para vincular el medio de pago.	Compras, Tesorería	27 oct
Territorios de cada gerencia regional y responsable de Veracruz.	Transportes	26 oct
Visto bueno de este libro, por correo.	Transportes	26 oct

Visto bueno · Bimbo

Juan Corte
Transportes

Por Uvicuo

José María Tabares
Operaciones

Qué necesitamos de ustedes

Respondan con su visto bueno al correo de este libro a más tardar el lunes 26 de octubre, antes de la prueba controlada. Cualquier cambio posterior se acuerda en la sesión semanal y queda en una versión nueva.

ANEXOS

Formatos y glosario

A Formato de incidente

Se reporta en el grupo de WhatsApp 24/7. Con estos cinco datos, Soporte Uvicuo puede gestionar el incidente sin volver a preguntar.

Dato	Ejemplo
Número económico	`PUE-1234`
Número de tag	`Últimos 6 dígitos`
Caseta y sentido	Caseta y hacia dónde va la unidad
Qué pasó	No abrió la pluma, cobro en efectivo, lector apagado
Hora	`14:35`

B Formato de pedido de tags

Un correo por pedido, con el visto bueno de gasto de la gerencia regional en copia.

Dato	Detalle
Territorio	Puebla, Villahermosa, Veracruz o Mérida
Tipo de pedido	Tag adicional, reposición, alta o baja de unidad
Unidades	Número económico y tipo de unidad
Cantidad	Tags que se necesitan
Dirección de entrega	Donde Televía envía los tags

C Glosario

Término	Qué significa en este proyecto
Aclaración	Reclamo a la concesionaria por un cobro que no corresponde.
Aviso a concesionarias	Informar antes del arranque qué tags nuevos van a cruzar cada ruta, para reducir rechazos.
Cruce sin viaje	Cruce cobrado de una unidad sin viaje abierto en Aliado.
Folio	Número con el que se da seguimiento a una aclaración.
Migración	Cambio del tag anterior por el de Televía en todas las unidades.
Prueba controlada	Una unidad por territorio en su ruta más complicada, antes de la migración.
Torre de control	Área de Bimbo que da seguimiento a los viajes de la región.
